

(仮称)第6特別養護老人ホーム新築工事の進捗状況


(令和3年9月9日更新)

(仮称)第6特別養護老人ホーム新築工事業

毎月の特別養護老人ホーム新築工事の進捗状況をお知らせします。
工事期間中は、ご不便やご迷惑をおかけ致しますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。



令和3年8月の現場状況

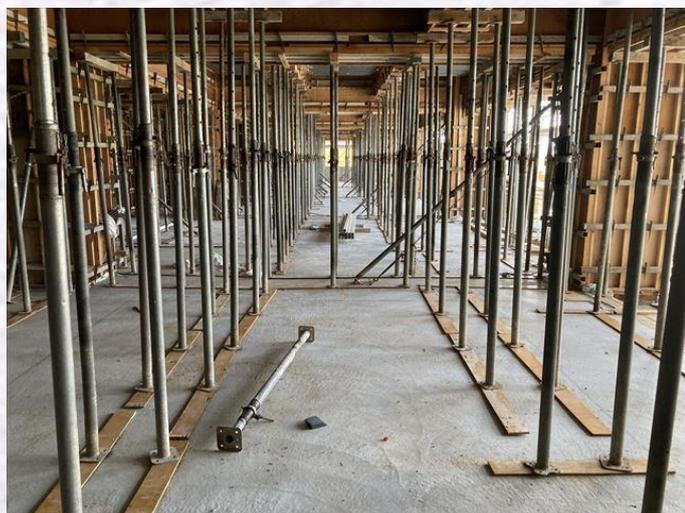

2階立上り躯体工事型枠支保工設置状況



2階立上り
躯体B工区(東側)梁・スラブ配筋状況




2階立上り躯体
A工区（西側）スラブ配筋完了、手摺段差型枠施工状況



2階立上り躯体B工区コンクリート打設状況



2階立上り躯体B工区コンクリートスラブ金鍍押え状況

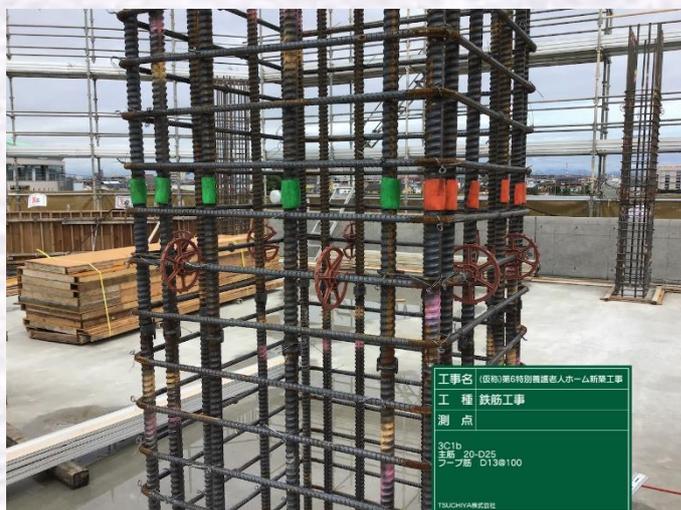

3階立上り躯体B工区柱配筋状況



3階立上り躯体B工区壁配筋状況



3階立上り躯体B工区梁架け、底スラブ貼り状況

工事名 (仮称)第6特別養護老人ホーム新築工事
工種 鉄筋工事
測点
3C1b
主筋 20-D25
サブ筋 13-D100
TOUCHYAMA建設

工事名 (仮称)第6特別養護老人ホーム新築工事
工種 鉄筋工事
測点 X8-X7、Y8-Y10
W16
高さ補強 縦筋 2-D13
横筋 2-D13
斜筋 D13
TOUCHYAMA建設



3階A工区柱配筋状況



3階立上り躯体 B工区デッキスラブ貼り状況



1階B工区 型枠解体完了状況



1階B工区 天井内配線・配管



北西より北側（正面）撮影



南西より南側撮影



1階 平面図



2階 平面図



3階 平面図



北側立面図



南側立面図
